


# CSG材採取場所と運搬経路図

**引佐材**  
(北区引佐町栢窪)

平成29年 8月下旬～

**阿蔵材**  
(天竜区二俣町阿蔵)

平成25年10月上旬～

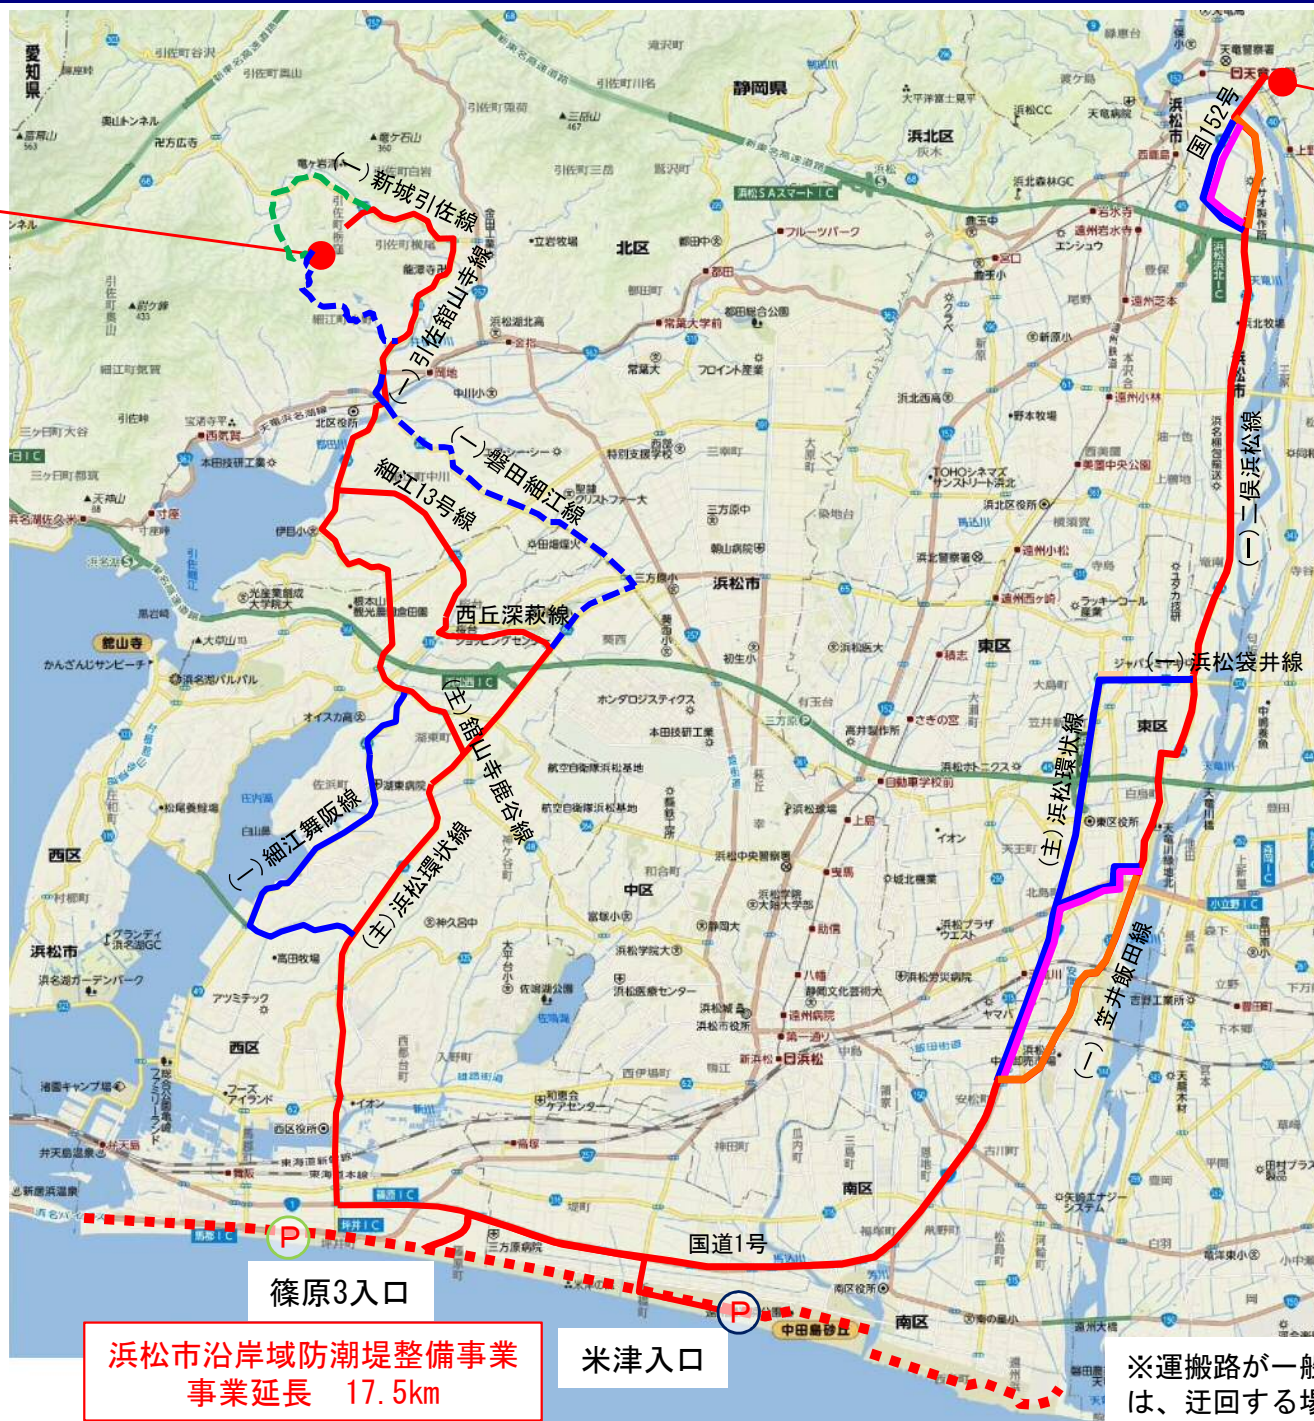

浜松市沿岸域防潮堤整備事業  
事業延長 17.5km

米津入口

※運搬路が一般車の事故等で渋滞している場合は、迂回する場合があります。

- 往路・復路
- 往路(ダンプトラック)
- 往路(トレーラダンプ)
- 復路



## ○運搬車両の種類

- ①CSG材(阿蔵材及び引佐材)運搬車両 (浜松市道路企画課、静岡県沿岸整備課)
- ②建設発生土運搬車両 (工事発注部署)
- ③購入土運搬車両 (静岡県沿岸整備課)

## ○運搬車両の識別

- ・運搬車両には識別プレートを掲示。
- ・更に、CSG材運搬車両にはバスマスクを掲示し、防潮堤整備事業のPRと交通安全意識の向上に努める。  
(雨天時は安全のためバスマスクは未装着)

①CSG材運搬車両 (阿蔵材)	(引佐材)
②建設発生土運搬車両 (浜松市発注工事)	(静岡県発注工事)

【CSG材(阿蔵材)運搬車両】

【CSG材(引佐材)運搬車両】






# 阿蔵材の搬出状況

※概ねの範囲を示しています。

【平成27年 5月 2日撮影】

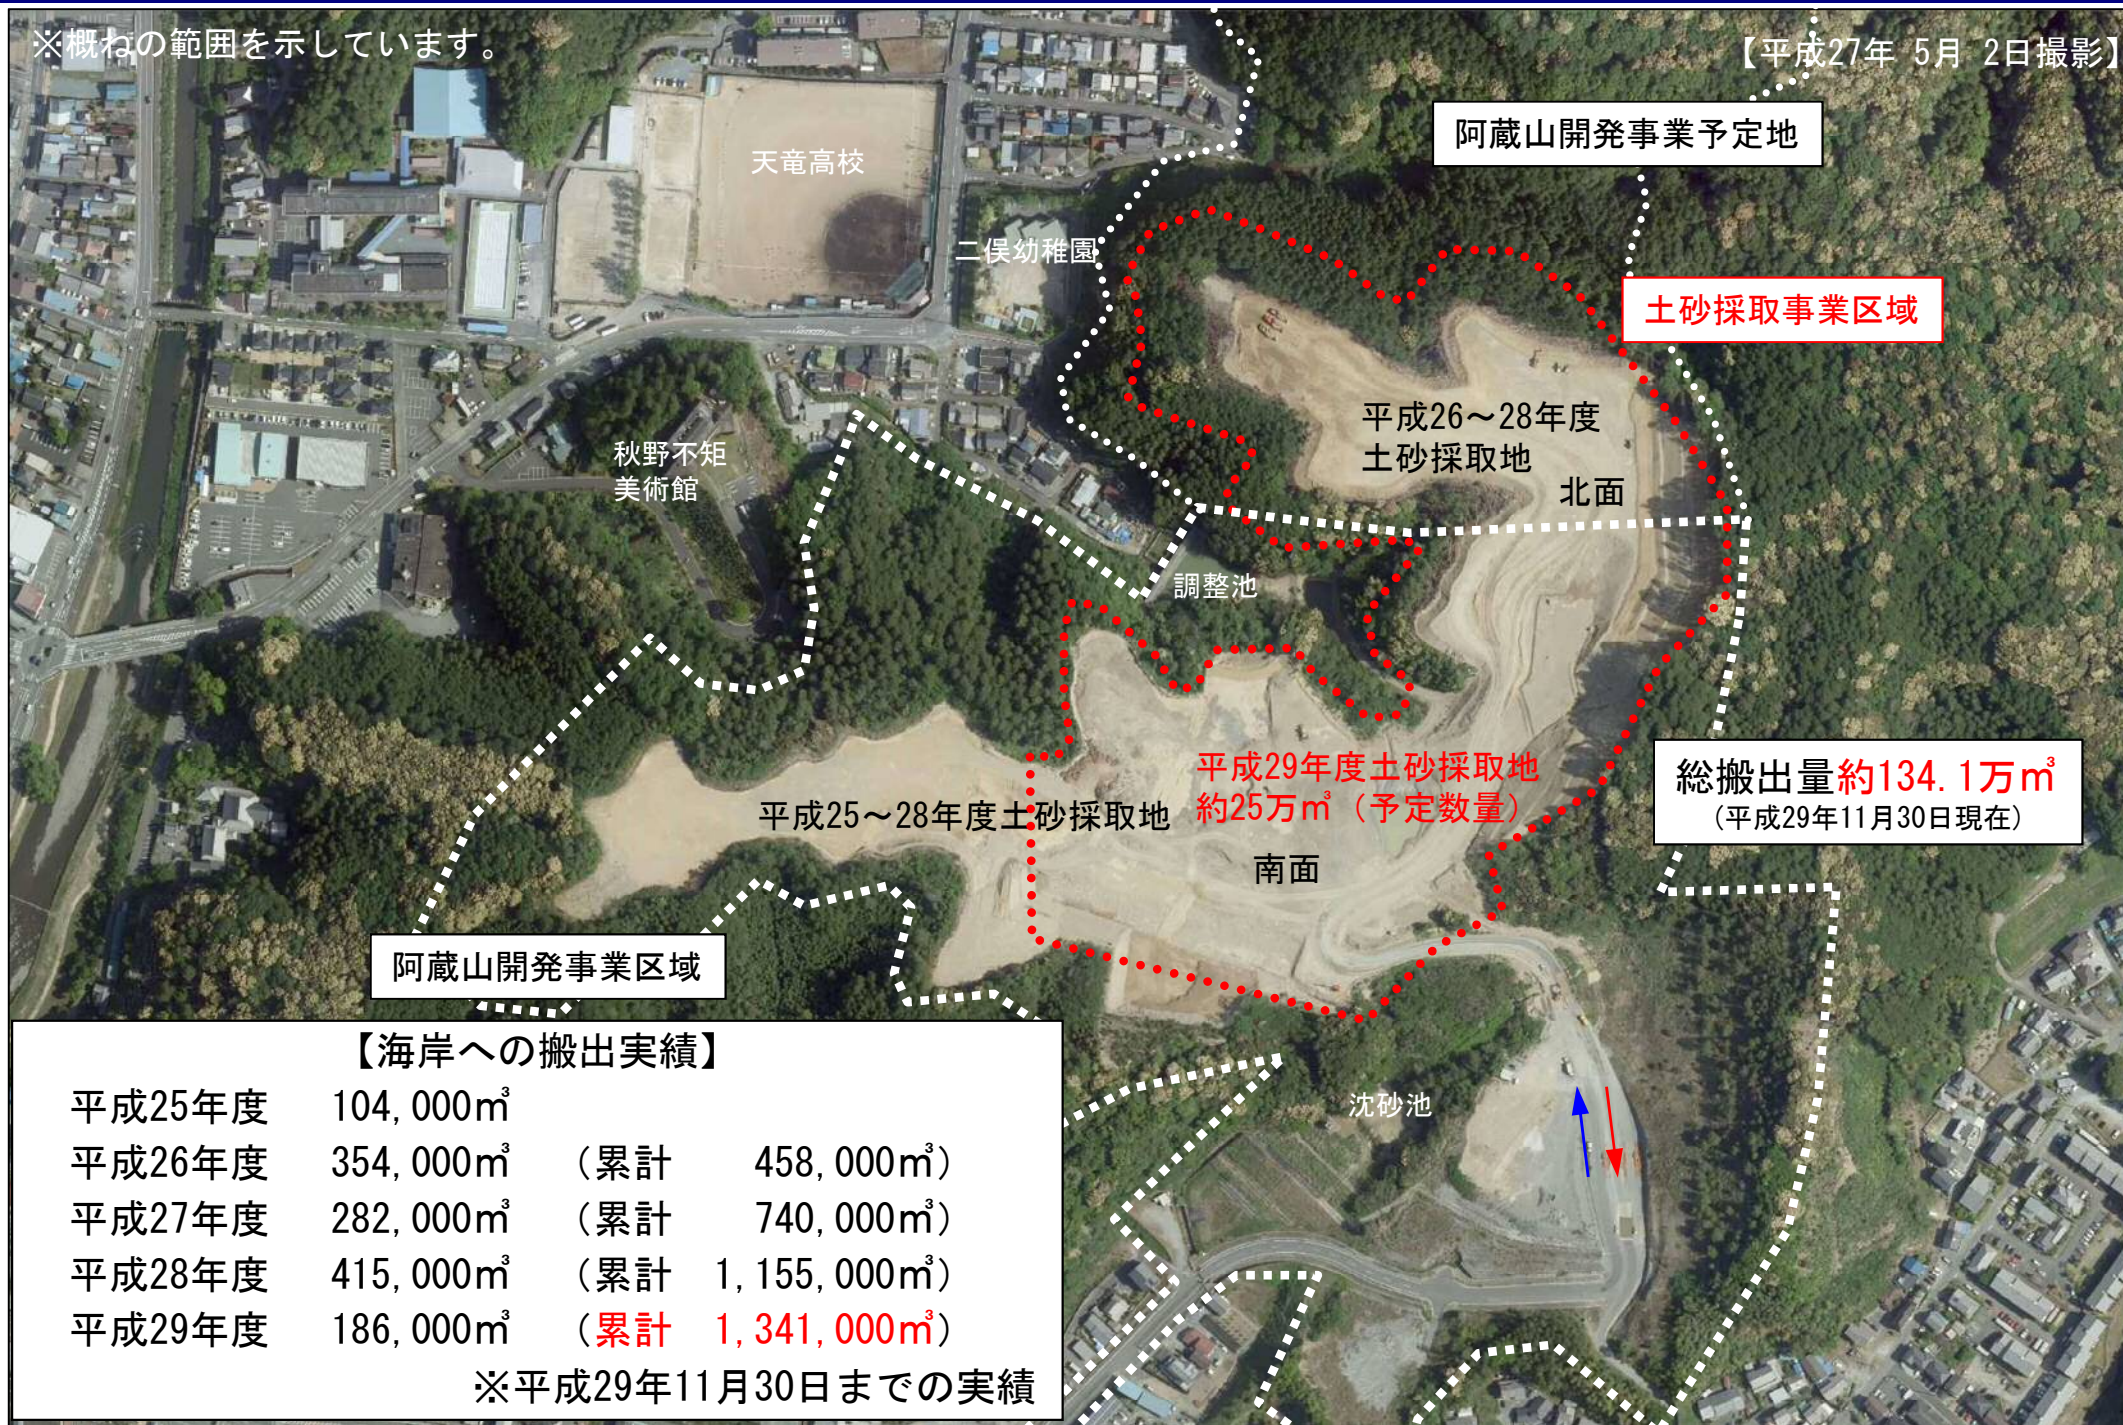





## 【引佐材の搬出計画 概要】

運搬期間 : 平成32年3月末まで (防潮堤完成予定)

台数 : ダンプトラック 延160~200台程度/日

運搬日 : 月曜日から金曜日まで (祝日を含む)

休止日 : 土曜日、日曜日

※平成30年度以降は工事の進捗に伴い、  
土曜日も実施する場合があります。

運搬時間 : 午前8時00分 ~ 午後5時00分を予定

## 【海岸への搬出実績】

平成29年度 **53,000m<sup>3</sup>**

※平成29年11月30日までの実績
