

市民文教委員会

スポーツ振興課

天竜B&G海洋センターについて

各種調査が終了したため、台風24号による被災後の進捗状況を報告します。

1 進捗状況

- ・台風24号による屋根の破損(被災箇所)は復旧。
- ・現在は、施設内部の梁や柱の補強工事を進めている。
- ・調査の結果、今後、被災箇所以外の屋根全体も修繕する必要があることが判明したため、今年度から来年度に掛けてそれら工事を実施していく予定である。
- ・施設再開は、令和3年4月を予定している。

2 これまでの経緯

- H30.9.30 … 台風24号により屋根の一部が破損
- H30.10.5 … 市民文教委員会に「台風24号被害状況について」報告
- H30.11.2 … 市民文教委員会に「台風24号によるスポーツ施設の休止について(H30.10.1～未定)」報告
- H30.12.25 … 市民文教委員会に「屋根改修工事について」報告
- ・H31.1～3月：被災箇所復旧工事、被災箇所以外の詳細調査
 - ・H31.4月～：施設再開(予定)、被災箇所以外の設計委託(予定)
 - ・H32.4月：被災箇所以外の改修工事(施設休館予定)、平成32年度内に再開予定
- H30.12.25 … 天竜区協議会に委員会報告内容を協議
- H31.2.15 … 市民文教委員会に「屋根改修工事について」報告
- ・鉄骨等の納期が長期化しており、資材調達に時間を要することが判明したため工事期間等を変更
 - ・被災箇所の復旧工事、被災箇所以外の調査:H31.1.8～H31.3.31⇒H31.1.8～H31.5.31
 - ・施設仮再開予定：H31.4.1⇒H31.6.1
- H31.2.25 … 天竜区協議会に委員会報告内容を協議
- H31.4.23 … 市民文教委員会に「屋根改修工事について」報告
- ・内部に腐食した状況が複数確認され、施設の安全性が確保されていないことが判明
 - ・早急に屋根全体に関する調査を行った後に改修計画を決定
 - ・改修計画が不確定のため、再開の目途は未定
 - ・詳細が判明次第、随時公表
- H31.4.24 … 前記内容を報道発表
- H31.4.24 … 天竜区協議会に委員会報告内容を協議

R1.7.5～ … 天竜B & G海洋センター構造用集成材劣化調査

- ・ 施設内部の他の梁に腐食を確認
- ・ 被災箇所以外の屋根に腐食が見られ、屋根全体が剥がれる可能性あり(3-①)


R1.8.23 … 屋根の災害復旧工事などが完了

台風24号による屋根の破損などは復旧しており、現在施設内部の梁・柱の補強工事を進めている。

施設内部梁の腐食



被災箇所以外の屋根を支える釘などの腐食

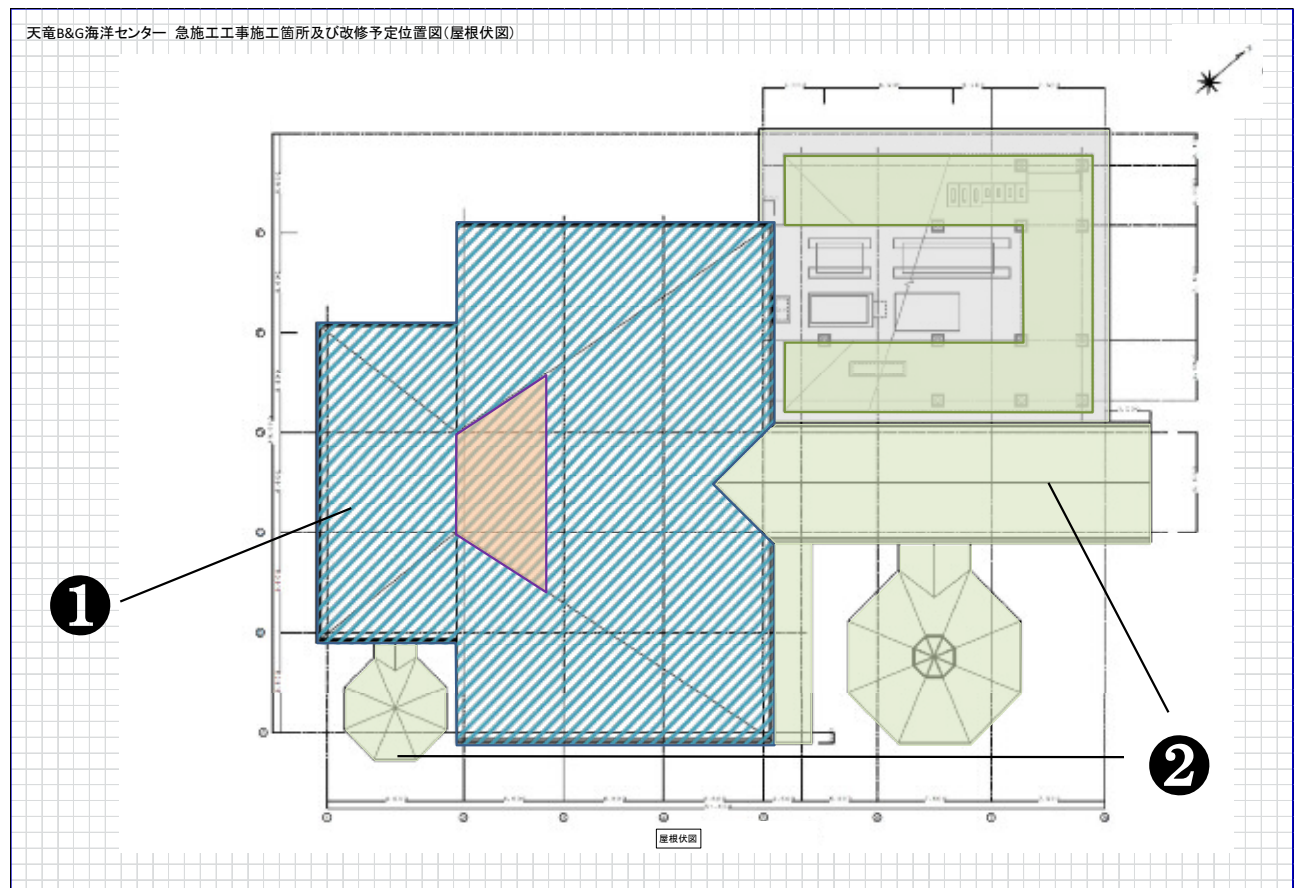

3 今後予定

- ①プール棟屋根修繕(被災箇所以外)、②屋根改修(プール棟以外の塗装)・外壁改修[公共建築課・長寿命化]ほか
- R2.1月～R2.6月[R1.11月補正] … 実施設計
- R2.8月～R3.3月[R2当初] … 工事
