第16号　令和7年1月30日発行

県道熊小松天竜川停車場線災害復旧だより

令和7年 1月号

発行元：浜松市 土木部 天竜土木整備事務所
●ご不明な点がある方は、発行元へお問い合わせください。
浜松市天竜区二俣町二俣481　電話：053-926-1561
メール：tn-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp

災害現場 ② ④

6月18日から終日全面通行止めとさせていただいております。
交通開放については、令和7年3月末を予定しています。

位置図

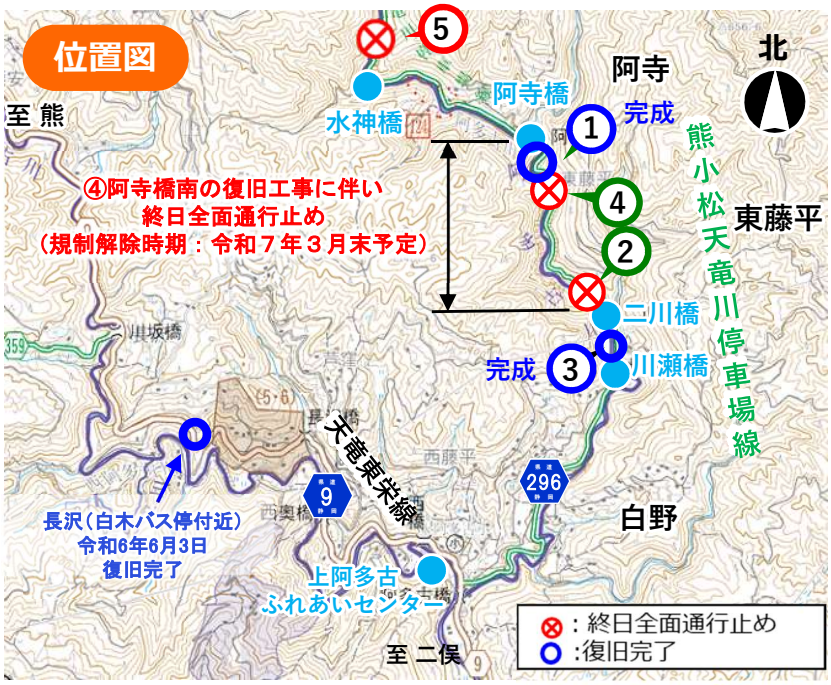

② 二川橋北

令和6年12月27日災害復旧完了

ただし、④の本復旧工事実施のため
令和7年3月末まで交通規制は継続

④ 阿寺橋南

復旧工法

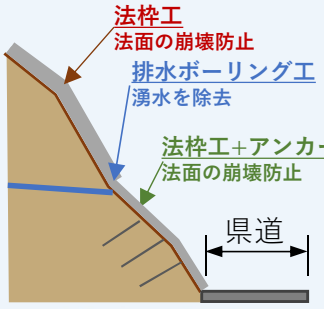

崩土除去【完了】
↓
法面掘削【完了】
↓
上部法枠工【施工中】
↓
水抜ボーリング工
↓
下部法枠工
↓
アンカー工

6月18日の降雨により法面再被災
※復旧完了見込：令和7年3月末予定

⑤ 水神橋北

路上落石撤去工【完了】
↓
既設落石防止網撤去工【完了】
↓
不安定岩塊掘削工【完了】
↓
岩塊破砕工・岩塊処分工
↓
落石防止網設置工
↓
舗 装 工

下記QRコードより通行規制の情報をご確認いただけます

浜松市 ホームページ

X（旧Twitter）

浜松市 防災ホッとメール
※登録ページに遷移します

天竜区（南部）・浜名区（北部）通れるマップ

R7.1.30現在

凡　例

- 国道
- 主要地方道
- 一般県道
- 市道
- ⊗ 全面通行止め箇所

【国道152号（龍山支所入口）～県道大輪天竜線（鮎釣）の管理基準値】
下記の管理基準値のいずれかを超過した場合に全面通行止め。

- 連続雨量 100mm以上（龍山雨量観測所
- 震度4以上の地震（天竜区内）
- 観測機器において設定した管理基準値

令和7年3月末規制解除見込

令和7年5月末
規制解除見込

令和7年3月末
規制解除見込

令和7年3月末
規制解除見込

＜規制実施＞
秋葉トンネル復旧工事により
令和6年5月15日午前10時から
終日通行止め

浜松市
ホームページ

土木スマホ
通報システム
「いっちゃお！」

X（旧Twitter）

浜松市
防災ホッとメール
※登録ページに遷移します

※写真は被災直後の状況、通行再開箇所については通行再開時の状況
