

令和8年6月17日

大型公共施設建設特別委員会

市民部スポーツ振興課
都市整備部公園課

四ツ池公園運動施設の再整備について

令和8年2月の静岡県議会において、遠州灘海浜公園篠原地区の野球場整備計画の検討期限が2028年度末までと示されるなど、結論が出ない状況が続いている。

その後の令和8年3月17日の当委員会における「まずは陸上競技場の整備を先行して進める方法を議論すべき」との意見を受け、再整備手法を検討したことから提案するもの。

1 検討状況

- ・令和5年7月の当委員会において、「1 四ツ池公園は陸上競技場を整備する」「2 陸上競技場は公認2種以上の施設とし、サブトラックを併設する」「3 現野球場の機能は静岡県において整備される野球場で担う」との整備方針を示した。
- ・令和6年度に開催した当委員会において、整備方針に基づく陸上競技場の検討結果として競技場新設を基本とした「第1種案」「第2種案」「第2種(第1種拡張)案」の3案を示した。

2 整備の方向性(案)

年間20万人以上の利用がある陸上競技場の整備に着手できない状況は、本市のスポーツ振興に大きな支障をきたすことから、次のとおり整備方針1及び2を先行して実行していく。

(1) 陸上競技場

- ・既存の第2種陸上競技場は、大規模改修によりリニューアル整備
- ・第2球場及び公園管理事務所を撤去し、サブトラックを新設
- ・駐車場は公園内の運動施設の敷地内確保を前提とした場合、立体構造の駐車場整備を検討
- ・陸上競技場、サブトラック、駐車場の整備は分割して実施

(2) 浜松球場

県の篠原地区野球場の結論が出るまで既存の状態で残置

3 スケジュール(案)

- ・令和8~9年度 基本計画策定
- ・令和10年度以降 基本設計、実施設計
- ・令和12年度以降 大規模改修工事

4 参考

- ・資料1 四ツ池公園運動施設の整備方針について
- ・資料2 四ツ池公園運動施設の整備方針に基づく検討状況について(令和7年2月4日)抜粋
- ・資料3 工事計画(案)

令和 5 年 7 月 4 日

大型公共施設建設特別委員会

市民部スポーツ振興課
都市整備部公園課

四ツ池公園運動施設の整備方針について

四ツ池公園運動施設の整備方針については、遠州灘海浜公園篠原地区に静岡県が新たにプロ野球開催可能な野球場を整備することを前提として、以下の内容のとおりとする。

- 1 四ツ池公園は、陸上競技場を整備する。

理由：陸上競技場は四ツ池公園以外にはないため。

- 2 陸上競技場は、公認 2 種以上の施設とし、サブトラックを併設する。

理由：全国規模の大会の開催と、現陸上競技場の特徴である市内のアスリートの練習の場を確保するため。

- 3 四ツ池公園内の現野球場の機能は、静岡県において整備される遠州灘海浜公園篠原地区の野球場で担うこととし、市が整備する野球場は、既存の野球場の機能向上も含め、高校野球の大会が開催できる規模とする。

理由：県の整備する野球場は、一定の規模及び機能が想定できるため。




市内の複数の野球場で大会等を実施しており、機能向上も対応可能なため。

附則

本整備方針は、遠州灘海浜公園篠原地区の野球場の整備の状況に大きな変化が生じた場合等は、必要な修正を行う。


(6) 陸上競技場の整備案と比較

令和7年2月4日大型公共施設建設特別委員会資料 抜粋


	1種案	2種案	2種(1種拡張)案
配置図			
メイン競技場規格/用途	公認1種(9レーン)/陸上専用	公認2種(9レーン)/陸上専用	公認2種(1種)/9レーン/陸上専用
メイン競技場収容人数	15,000人 うち、屋根付スタンド:9,000人	10,000人 うち、屋根付スタンド:5,000人	7,000人(15,000人) うち、屋根付スタンド7,000人
スタンド拡張エリアの有無	なし	なし	あり(8,000席)
メイン競技場建物面積	約30,000㎡	約18,000㎡	約24,000㎡
サブトラック	公認3種	非公認	公認3種
屋内練習場	メイン競技場内に設置	別棟として設置	メイン競技場内に設置
駐車場台数	680台	600台	640台

- ※ 数字は現時点での想定概算であり、今後の物価推移や計画進捗に伴い変更となる可能性がある
- ※ 2種(1種拡張)案の括弧書きは、拡張時を示す

- 1 事前工事：陸上競技場→2種公認更新工事（必要に応じ）
 第2球場、公園管理事務所
 →解体→園路、駐車場整備
 工期：1年

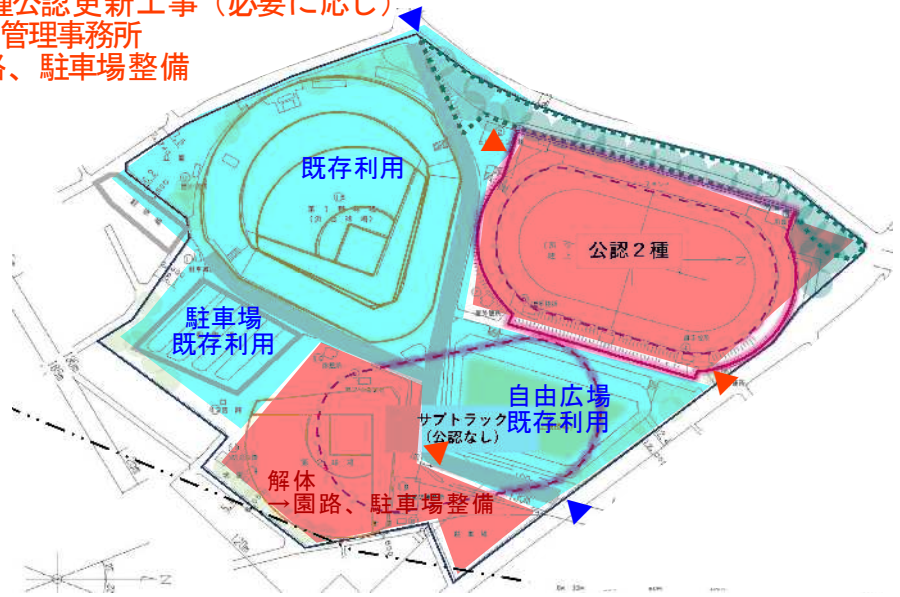

- 2 サブトラック整備：自由広場+園路解体→サブトラック整備
 工期：2年

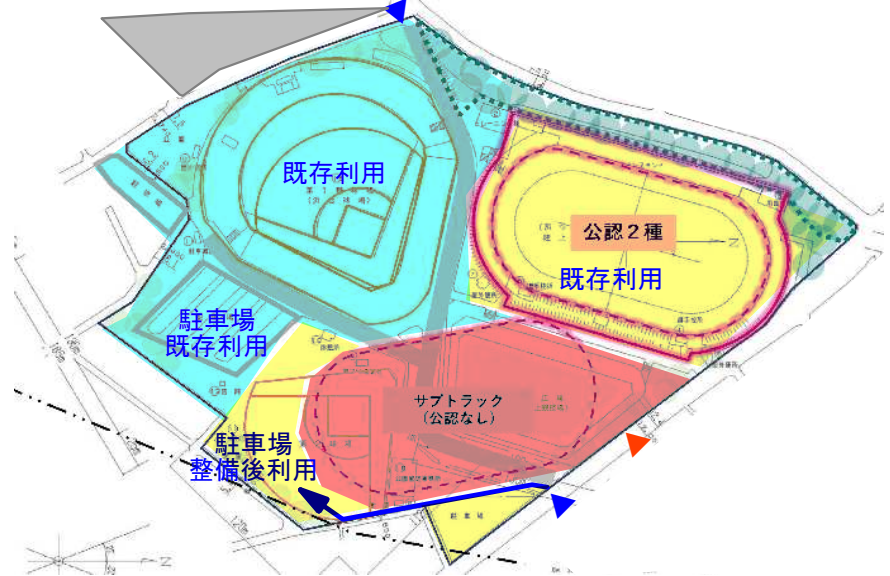

- 3 陸上競技場整備：スタンド棟→大規模改修
 トラック →大規模改修
 工期：2年

